

Toelichting site Verbeemen

26 juni 2019




1

PROCESVERLOOP


Procesverloop

historiek

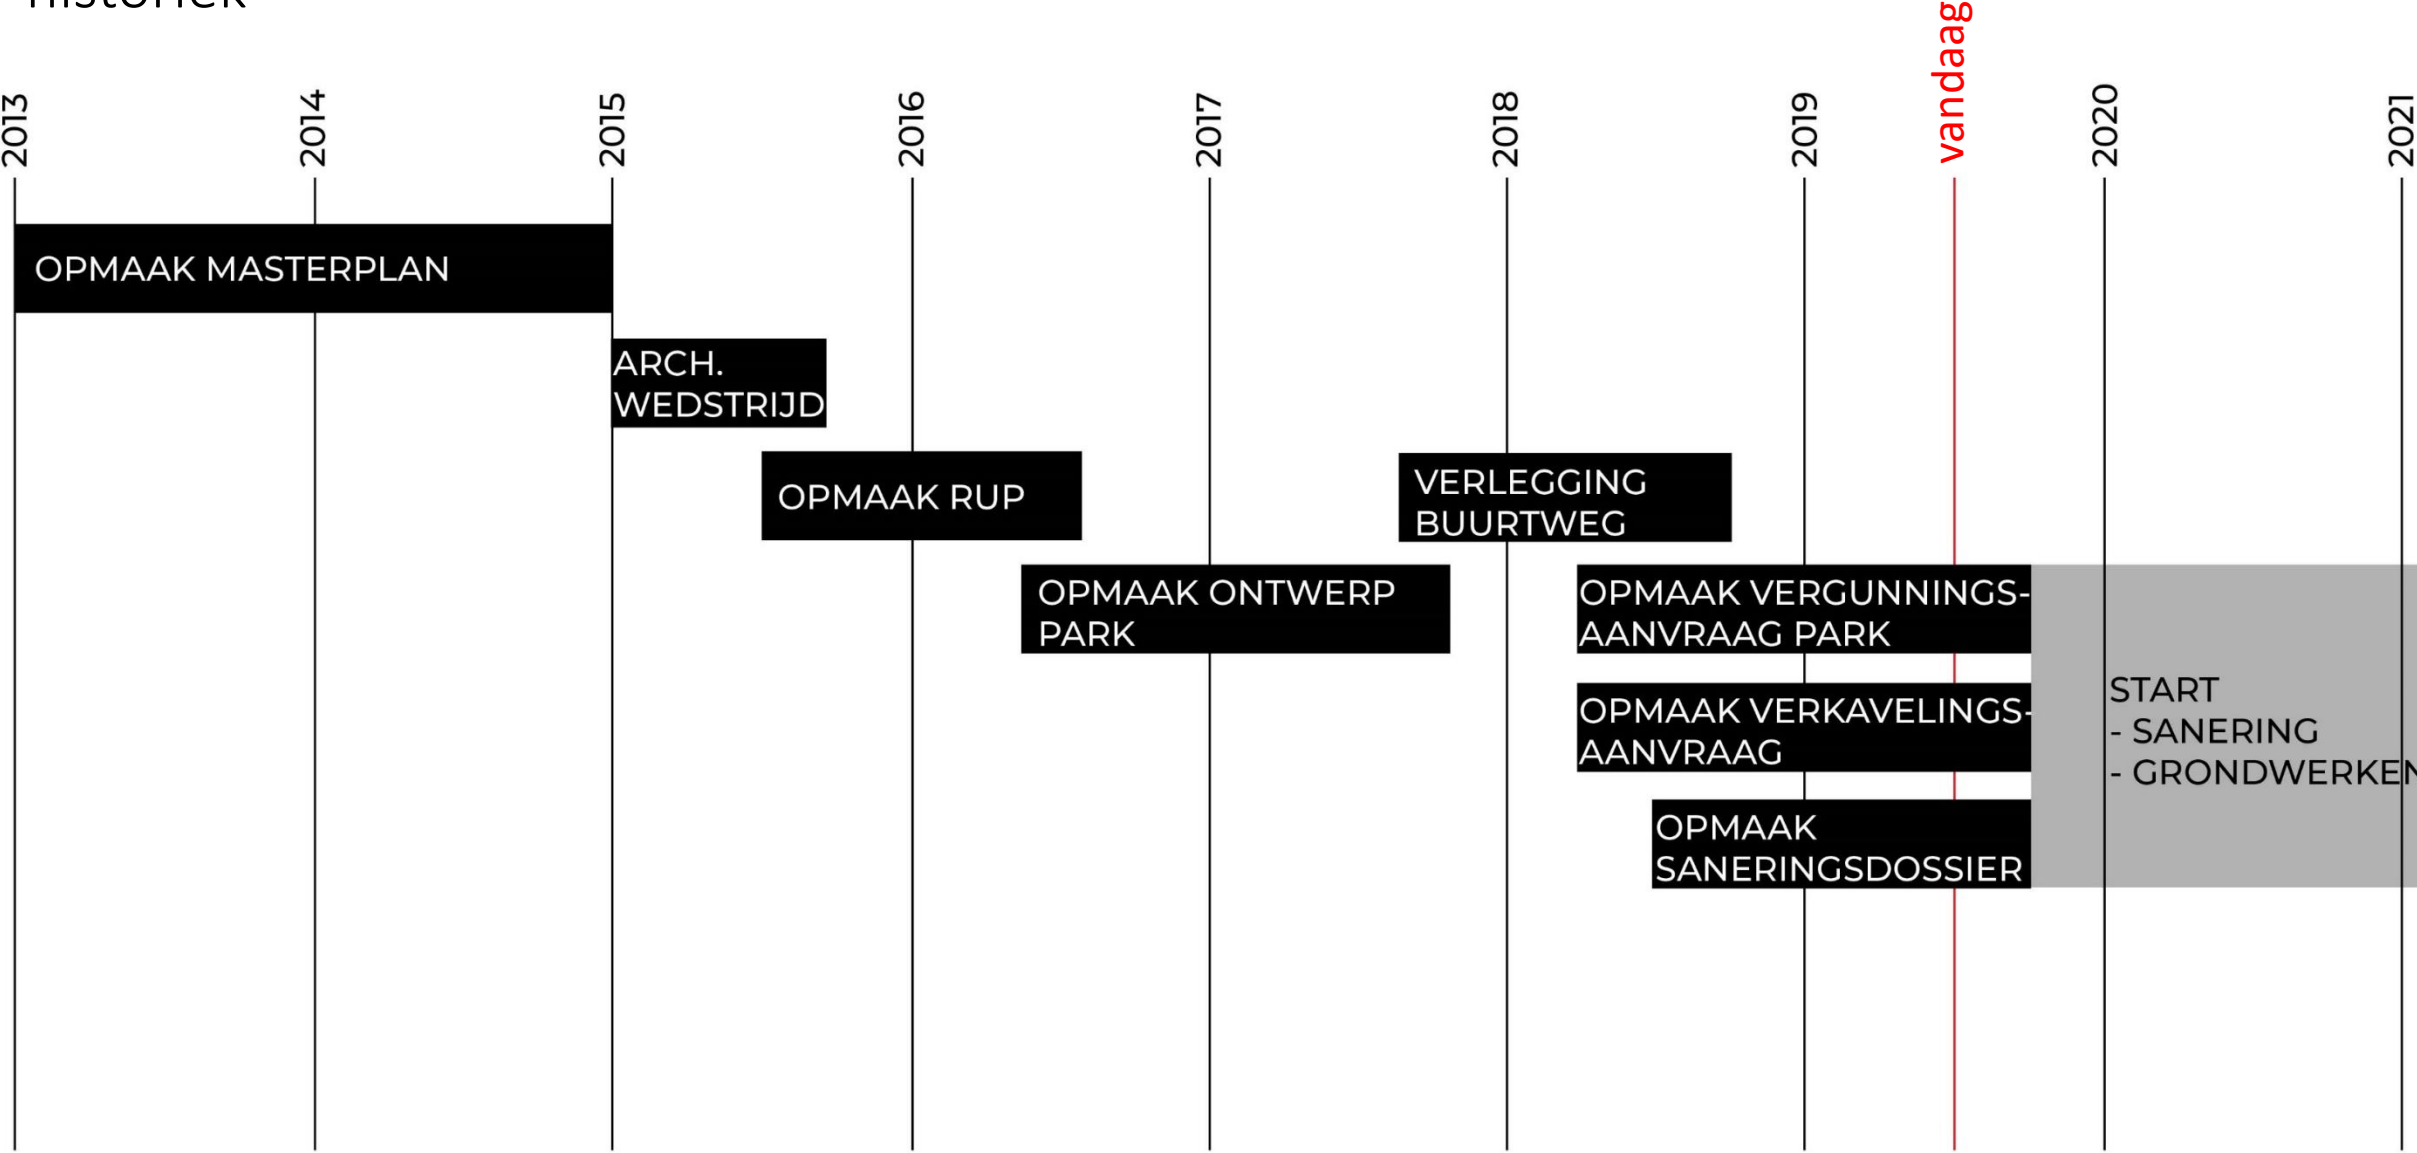


Procesverloop

historiek

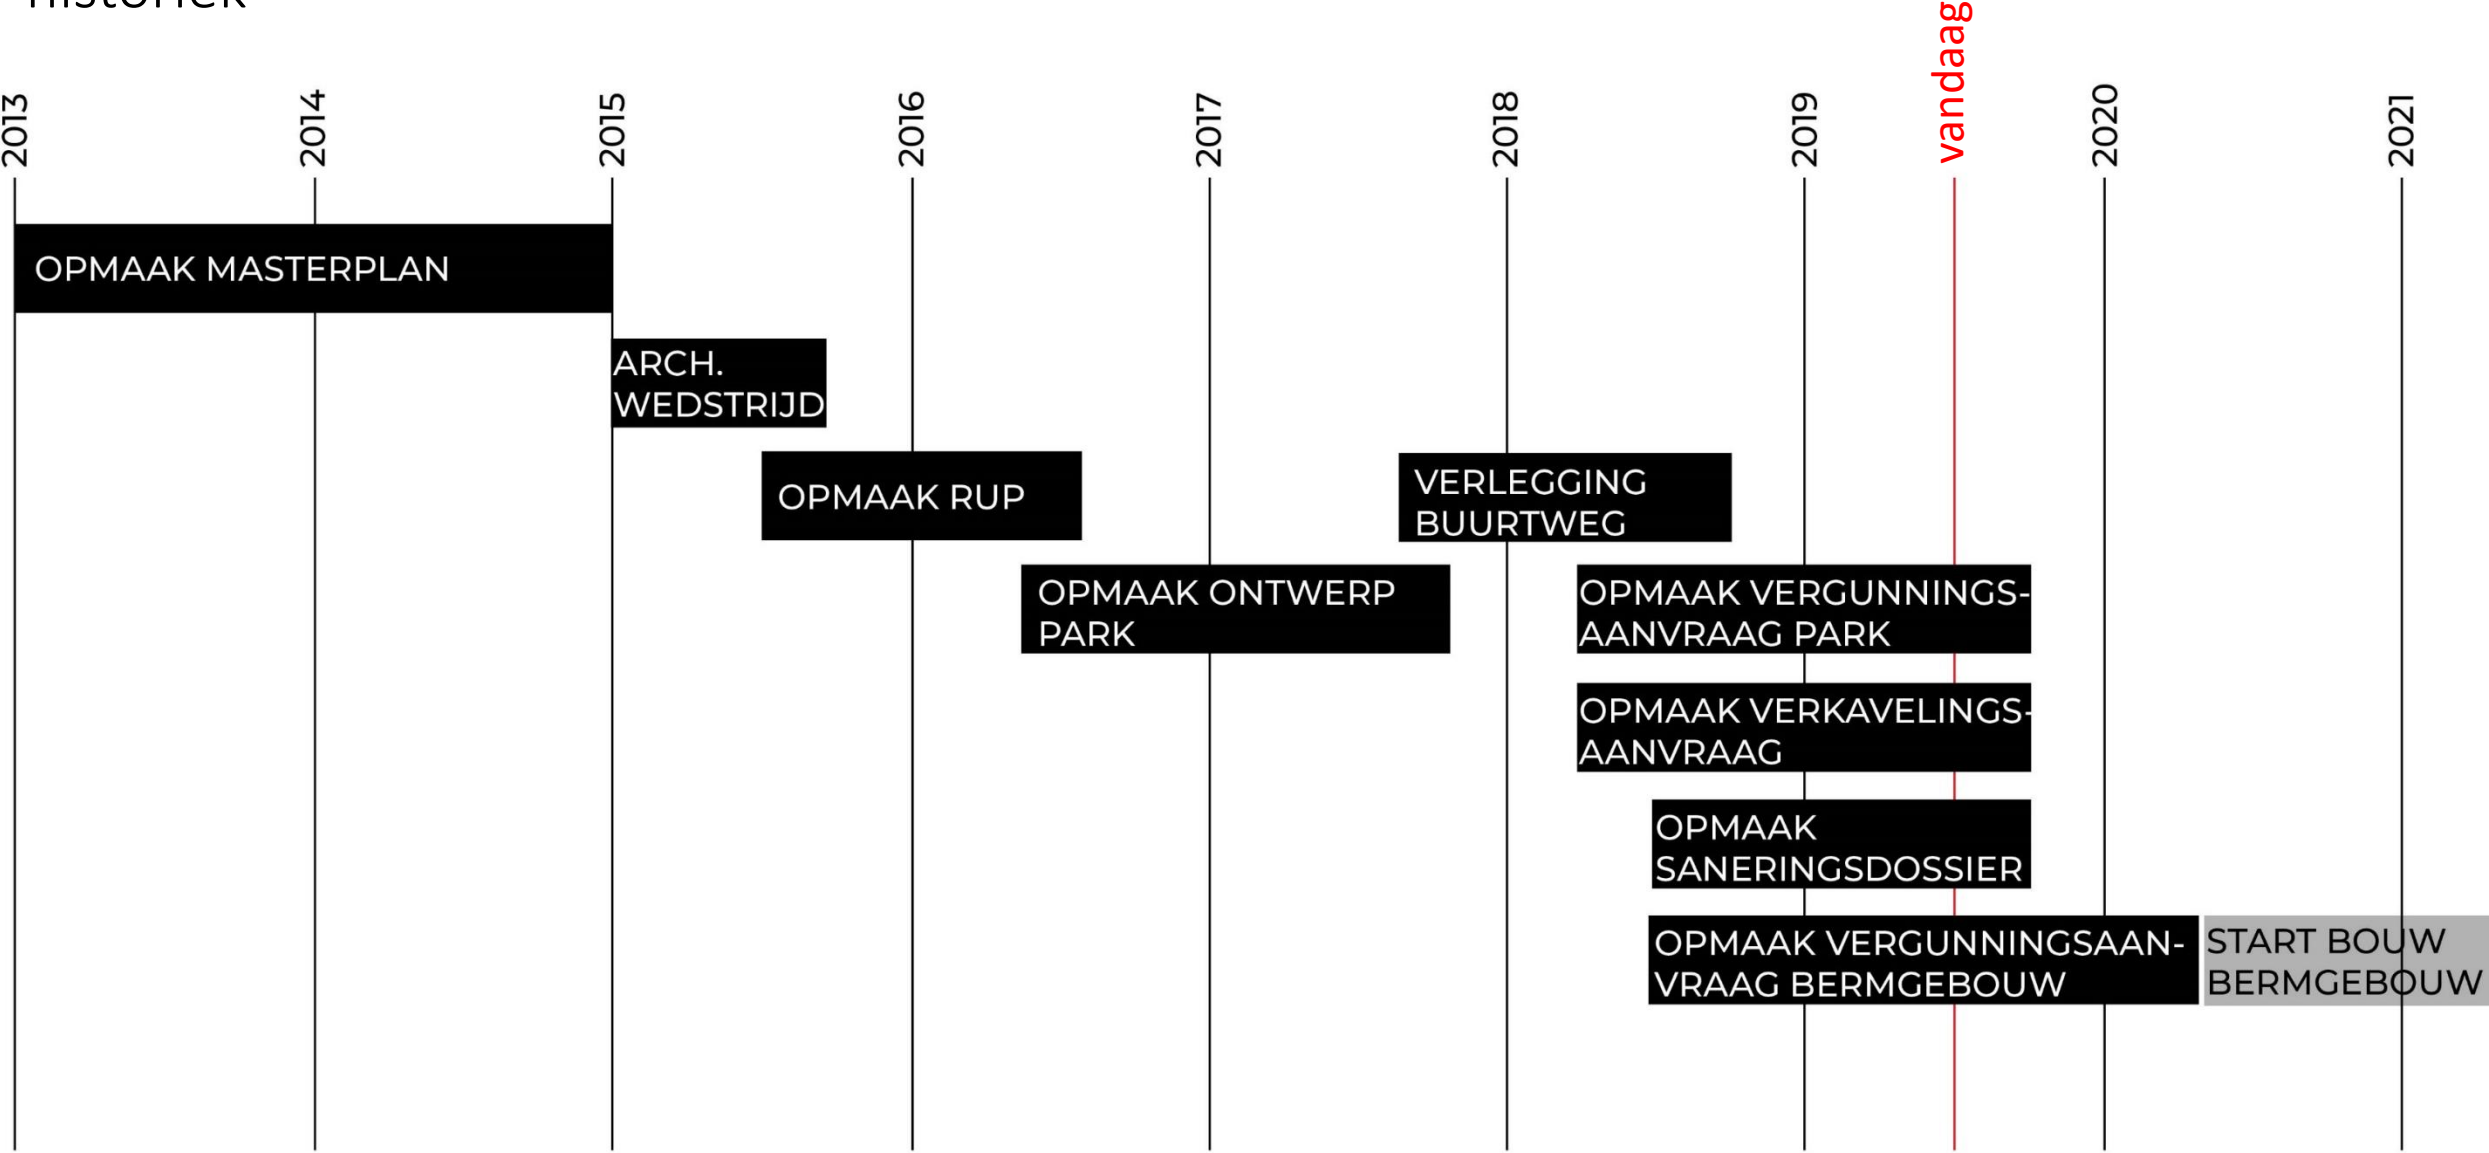

Procesverloop

historiek

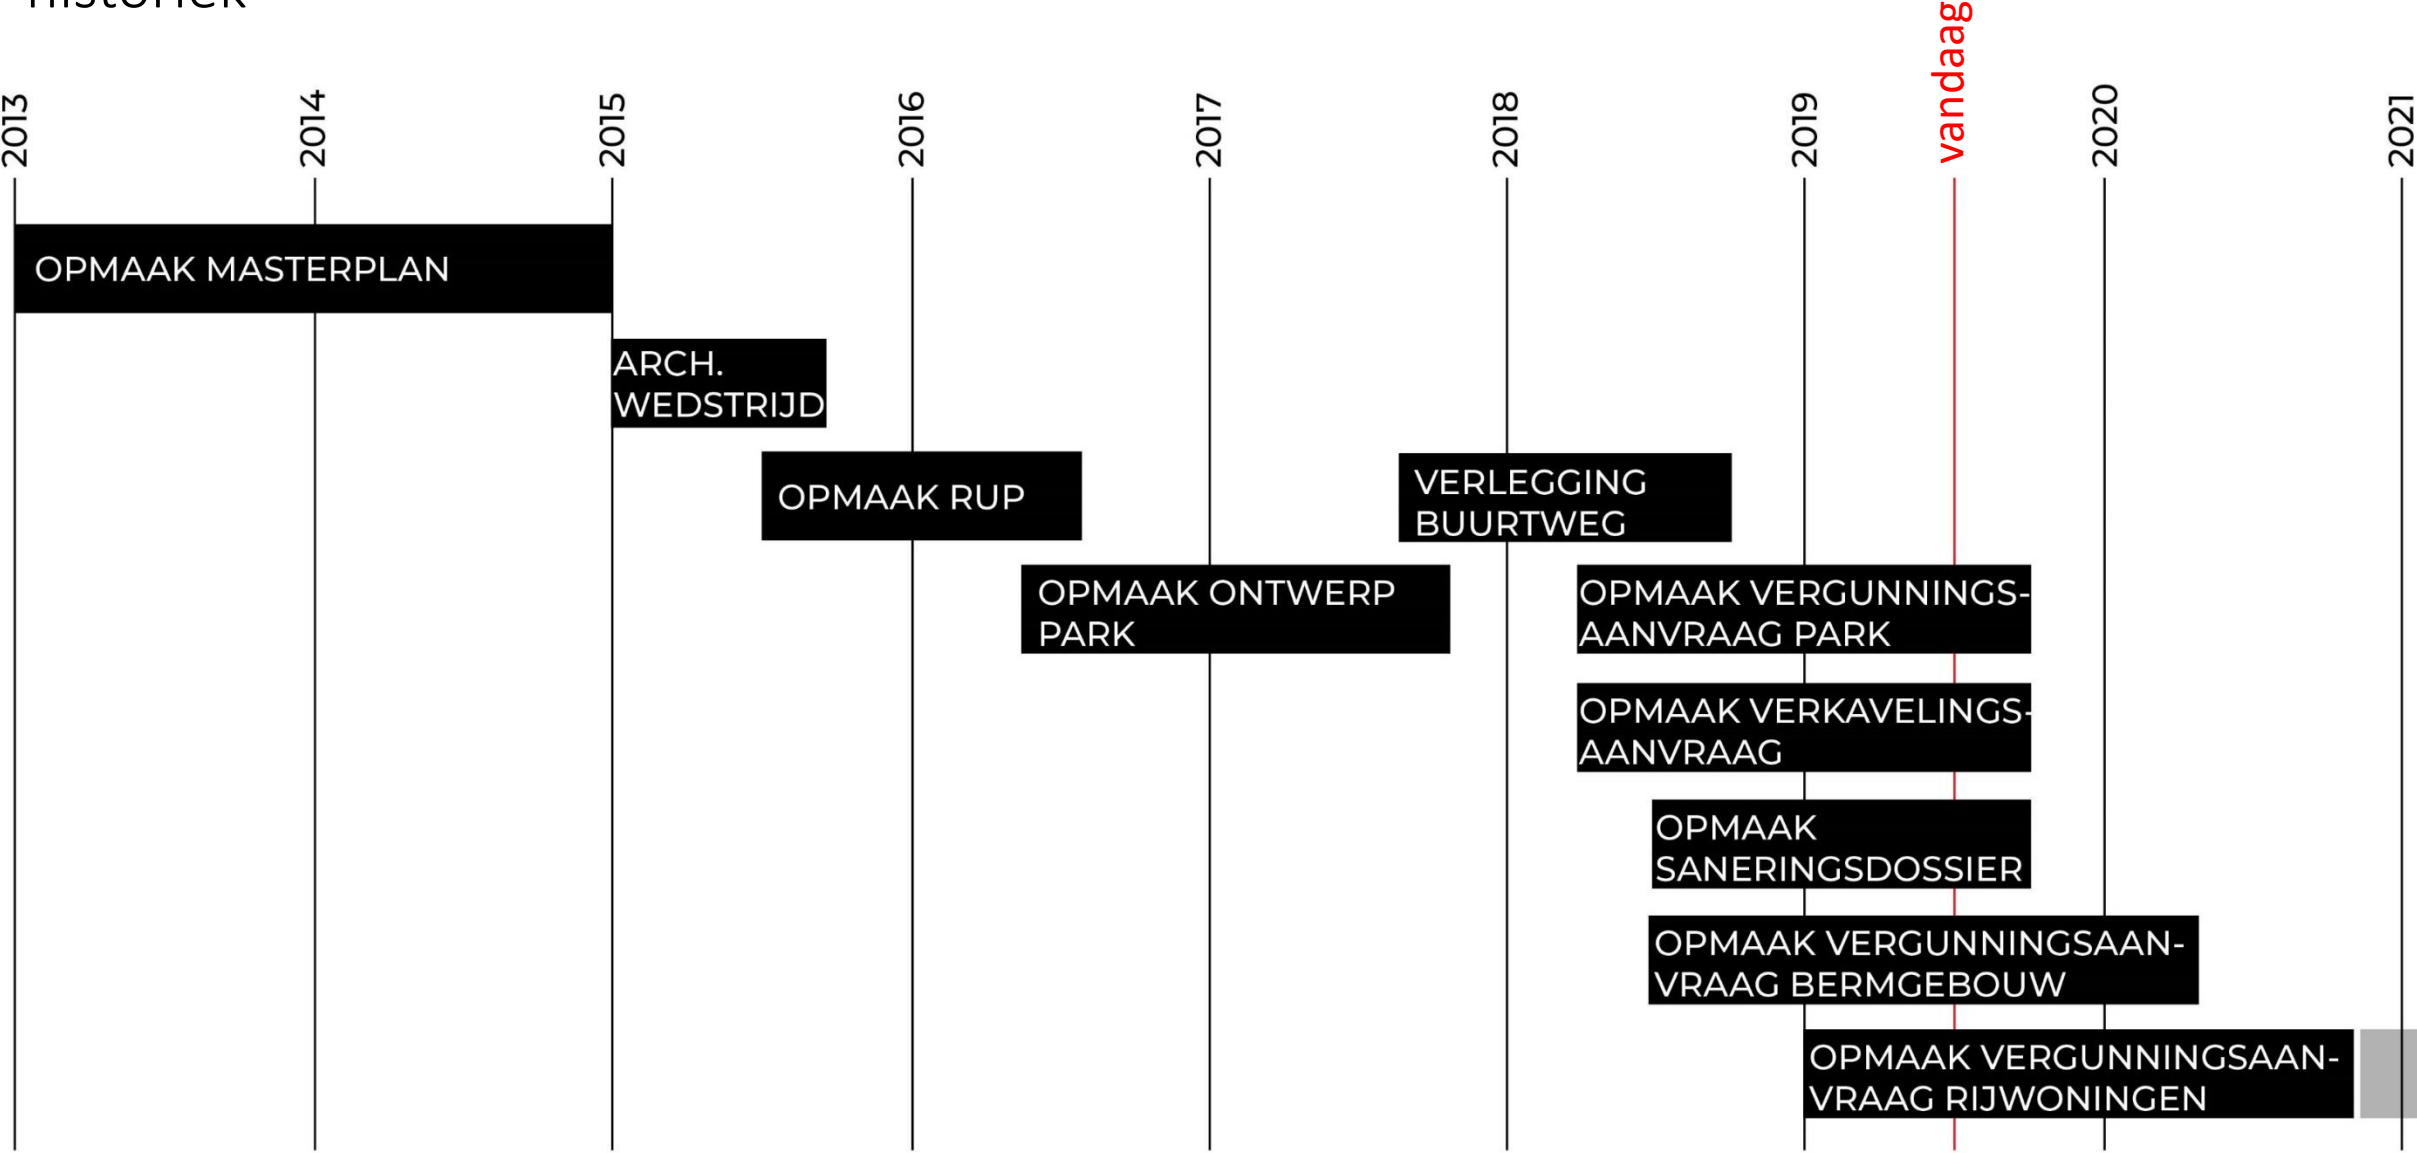


Procesverloop

planning van de werken

Fase 1: Vrijmaken van het terrein

- Wegnemen bestaande begroeiing
- Wegnemen betonplaat
- Verwijderen Oude-Sint Gommarusstraat

Timing: voorjaar 2020

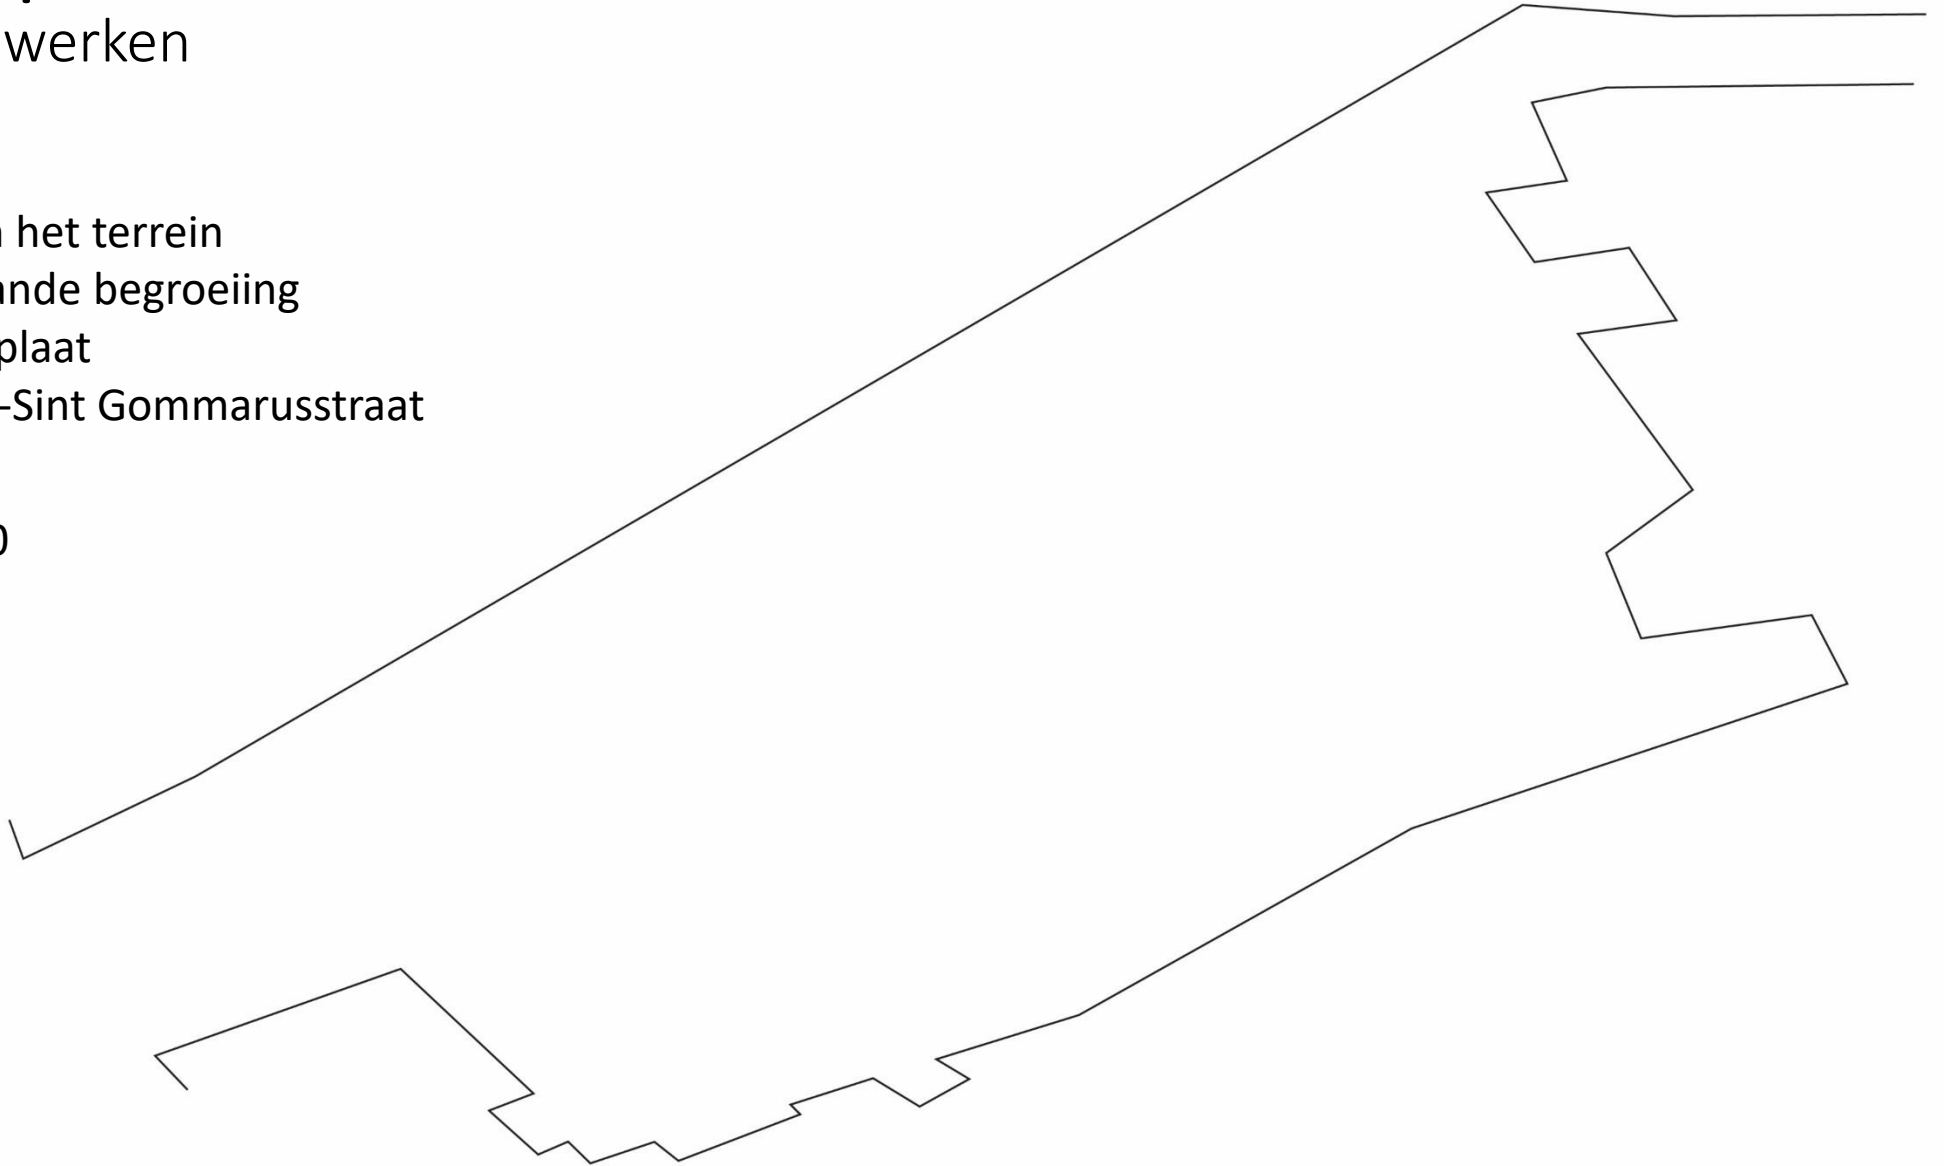


Procesverloop

planning van de werken

Fase 2: Sanering van de grond

- Wegnemen kernen van vervuiling
- Start sanering grondwater

Timing: voorjaar 2020

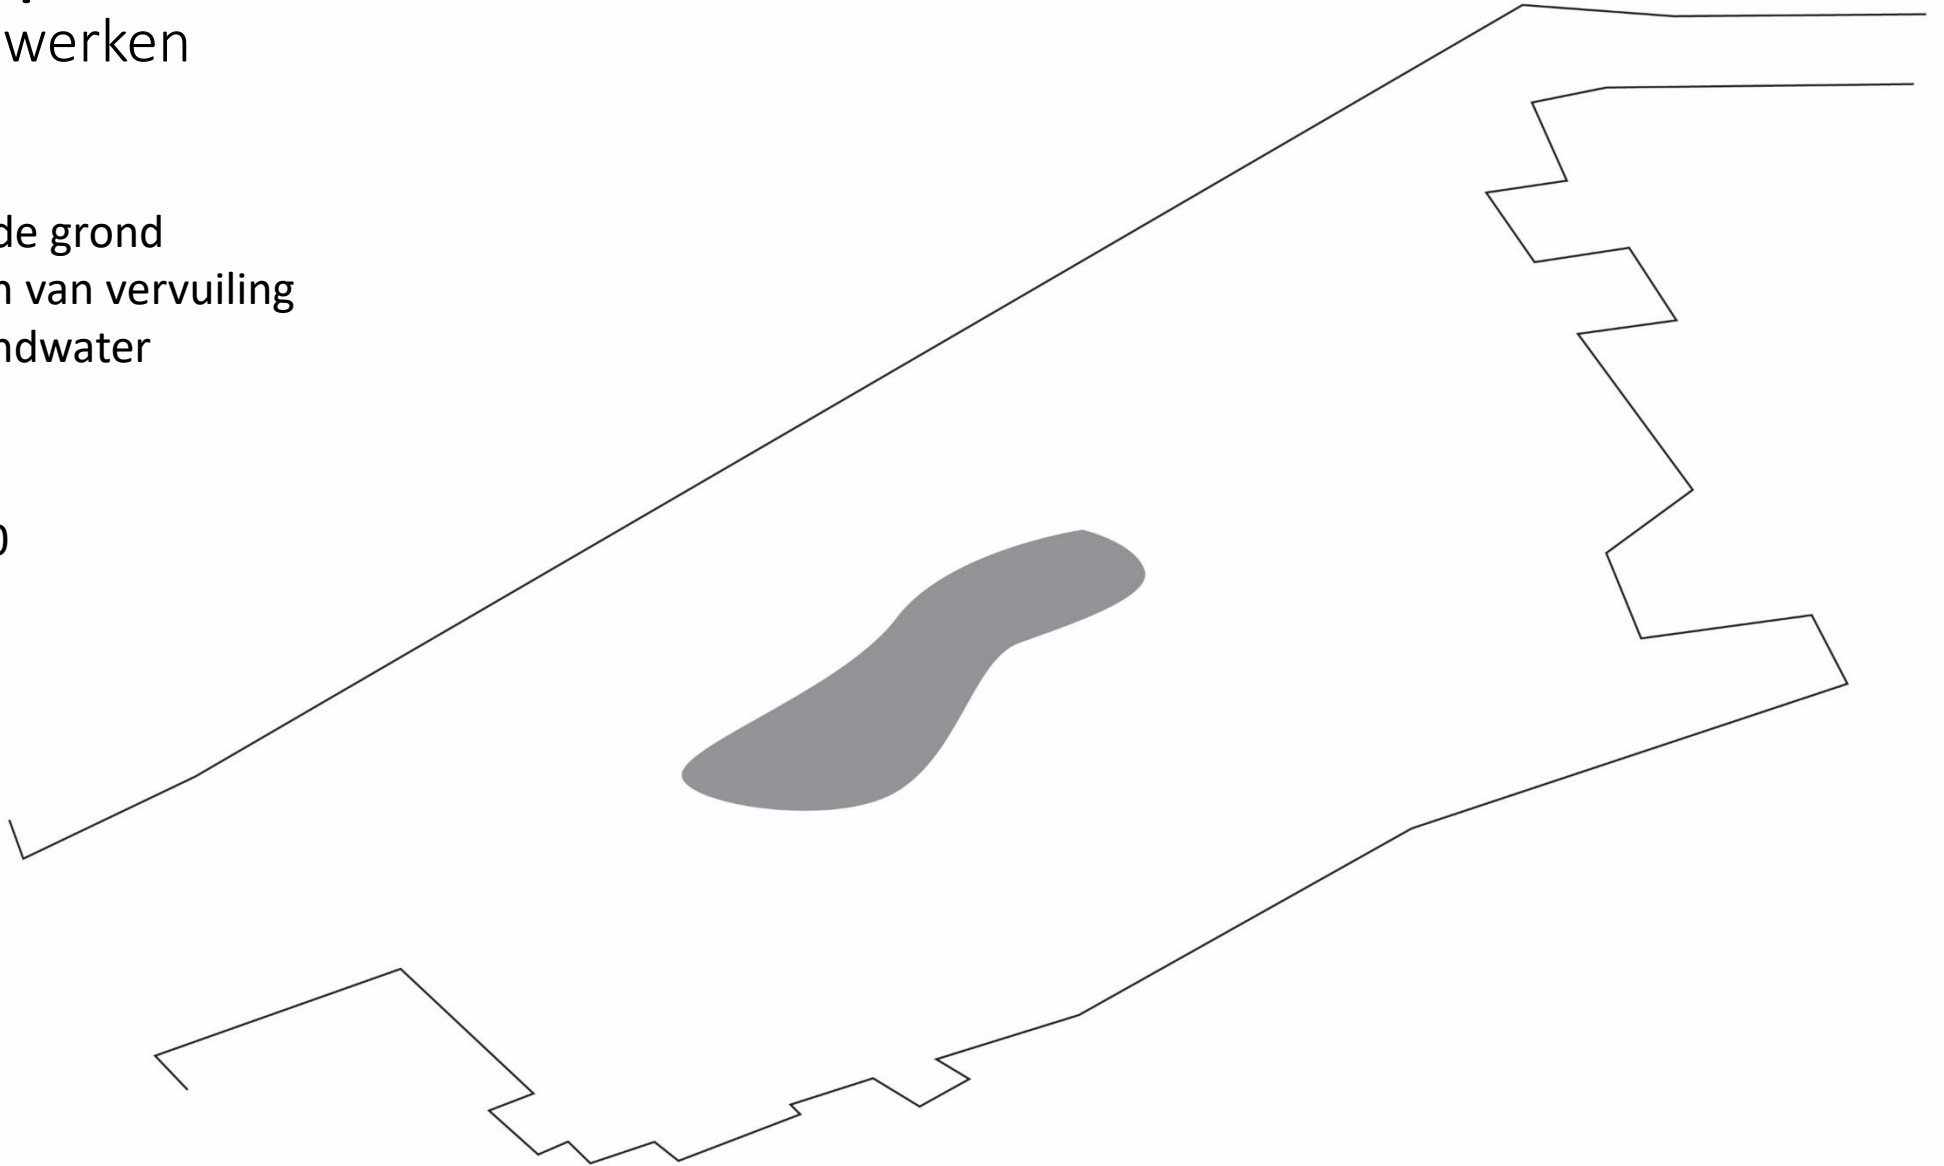


Procesverloop

planning van de werken

Fase 3: Grondwerken

- Graven ondergrondse kelder
- Aanvullen van het terrein met uitgegraven grond
- Rioleringswerken en voorzieningen water en elektriciteit

Timing: zomer en najaar 2020

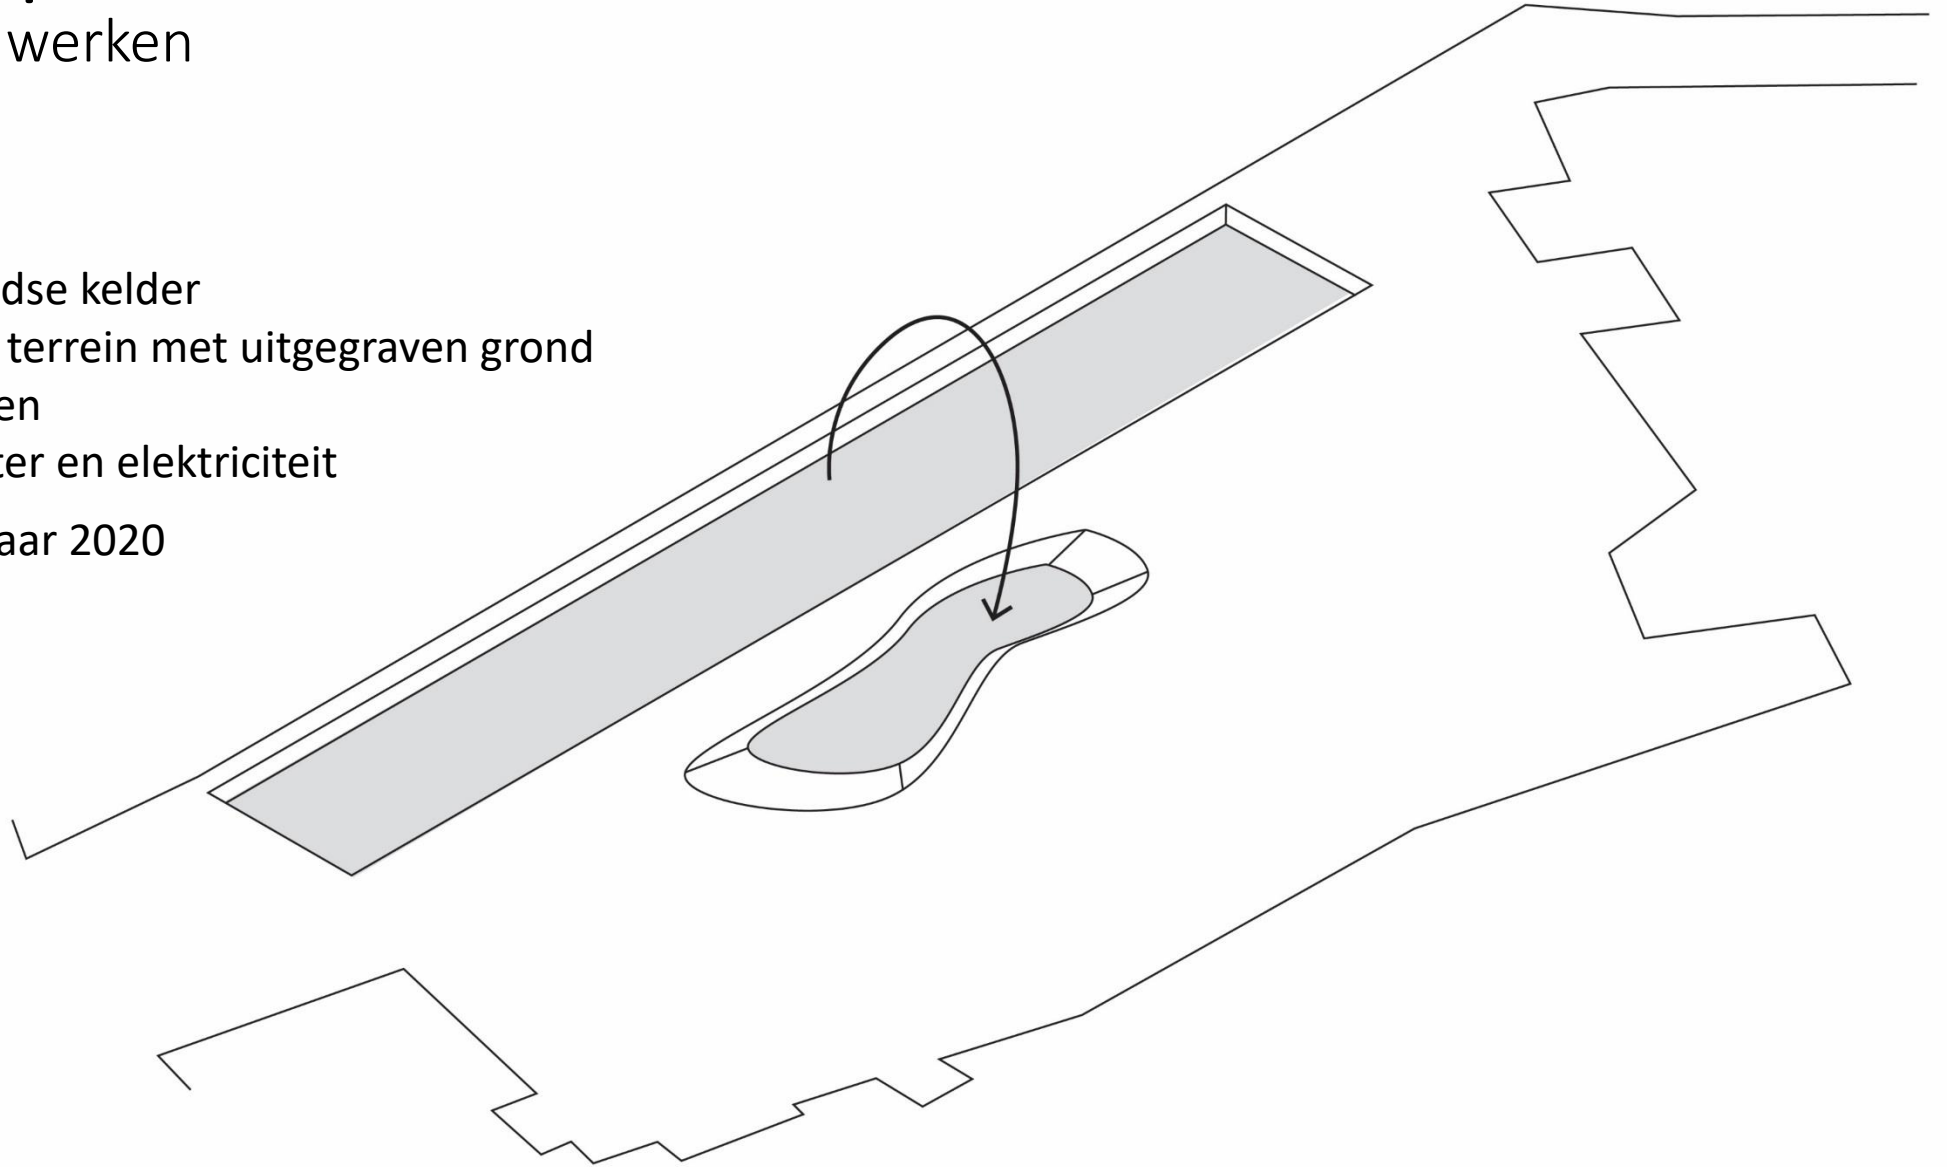


Procesverloop

planning van de werken

Fase 4: Bouw bermwoningen

Timing: start najaar 2020

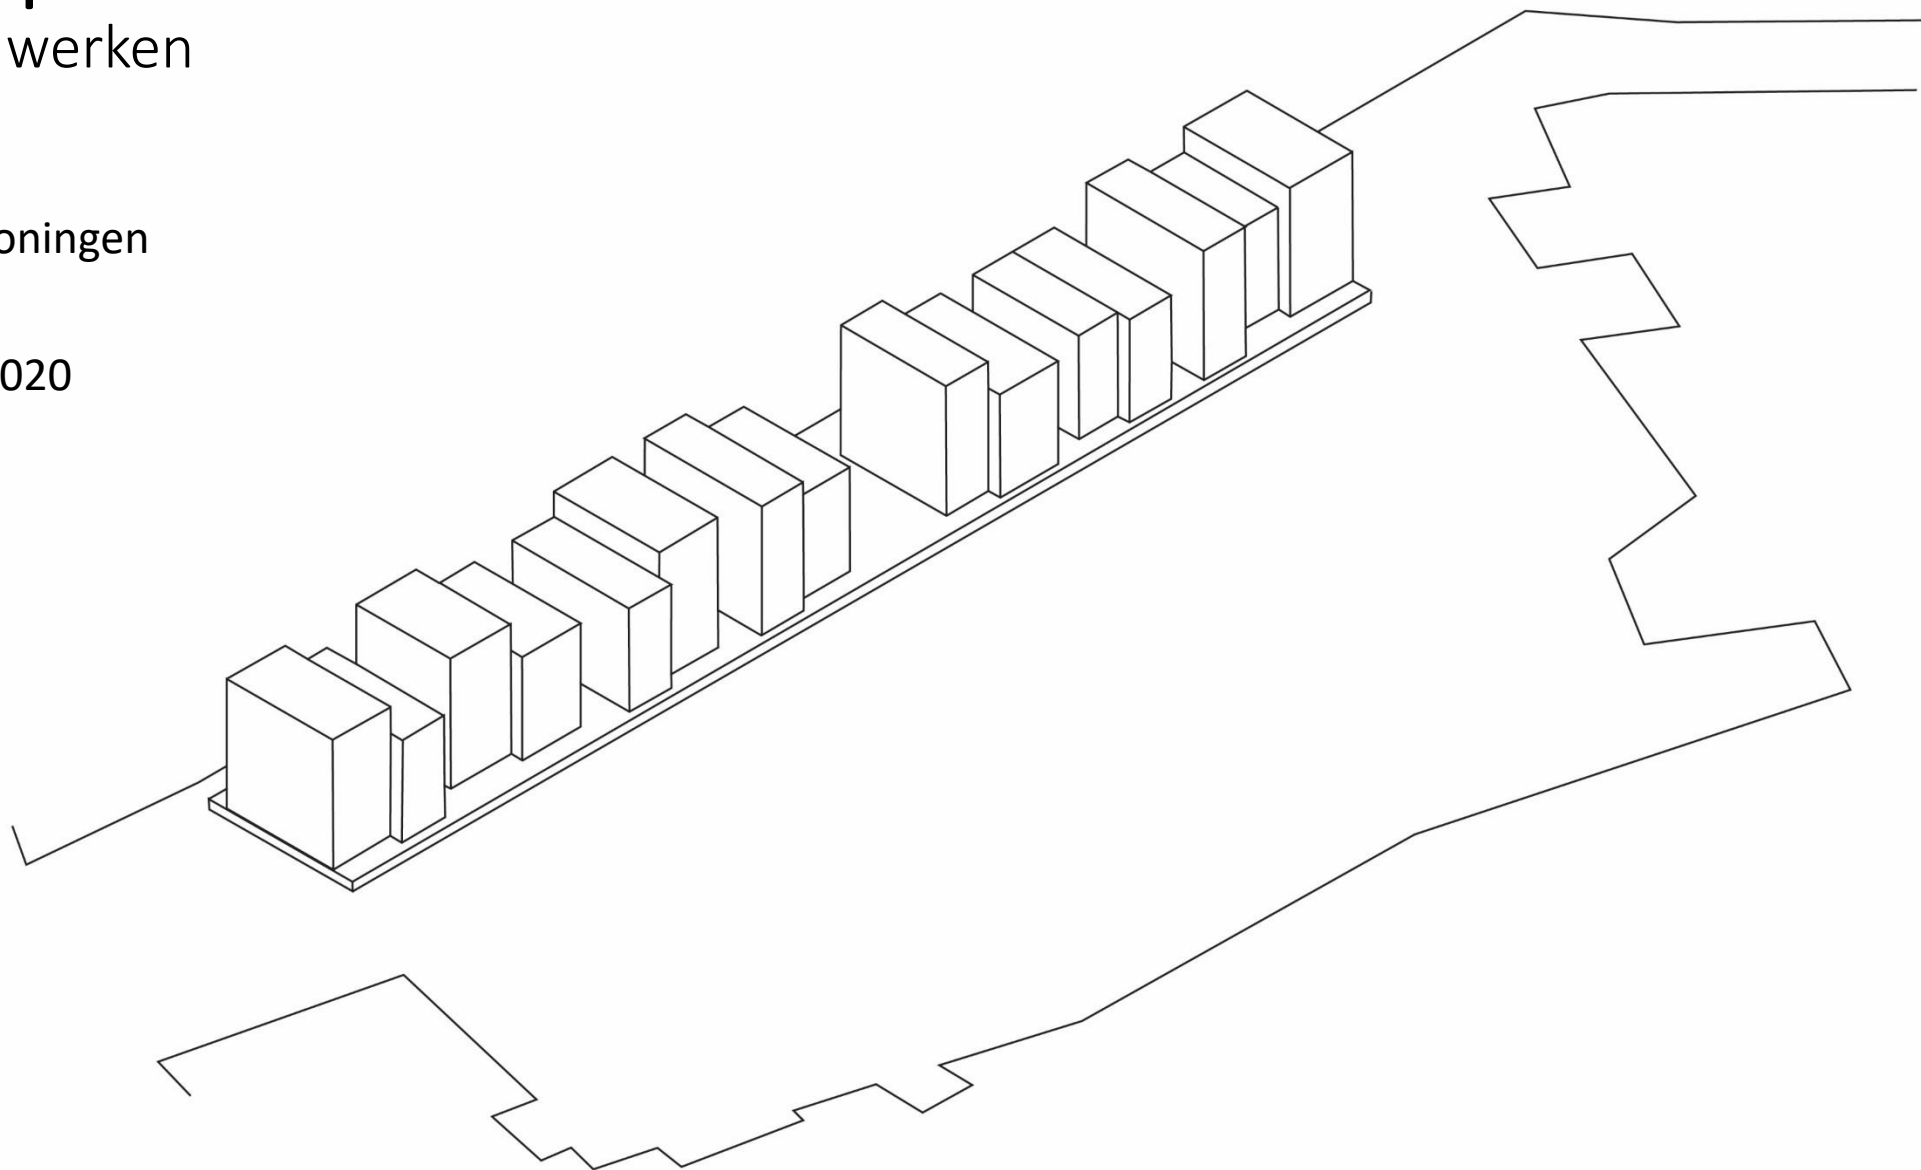

Procesverloop

planning van de werken

Fase 5: Aanleg park

- Aanleg park tot aan grens met rijwoningen
- Aanleg publieke parkeerplaatsen

Timing: start voorjaar 2021




Procesverloop

planning van de werken

Fase 6: Bouw rijwoningen


Timing: start zomer - najaar 2021

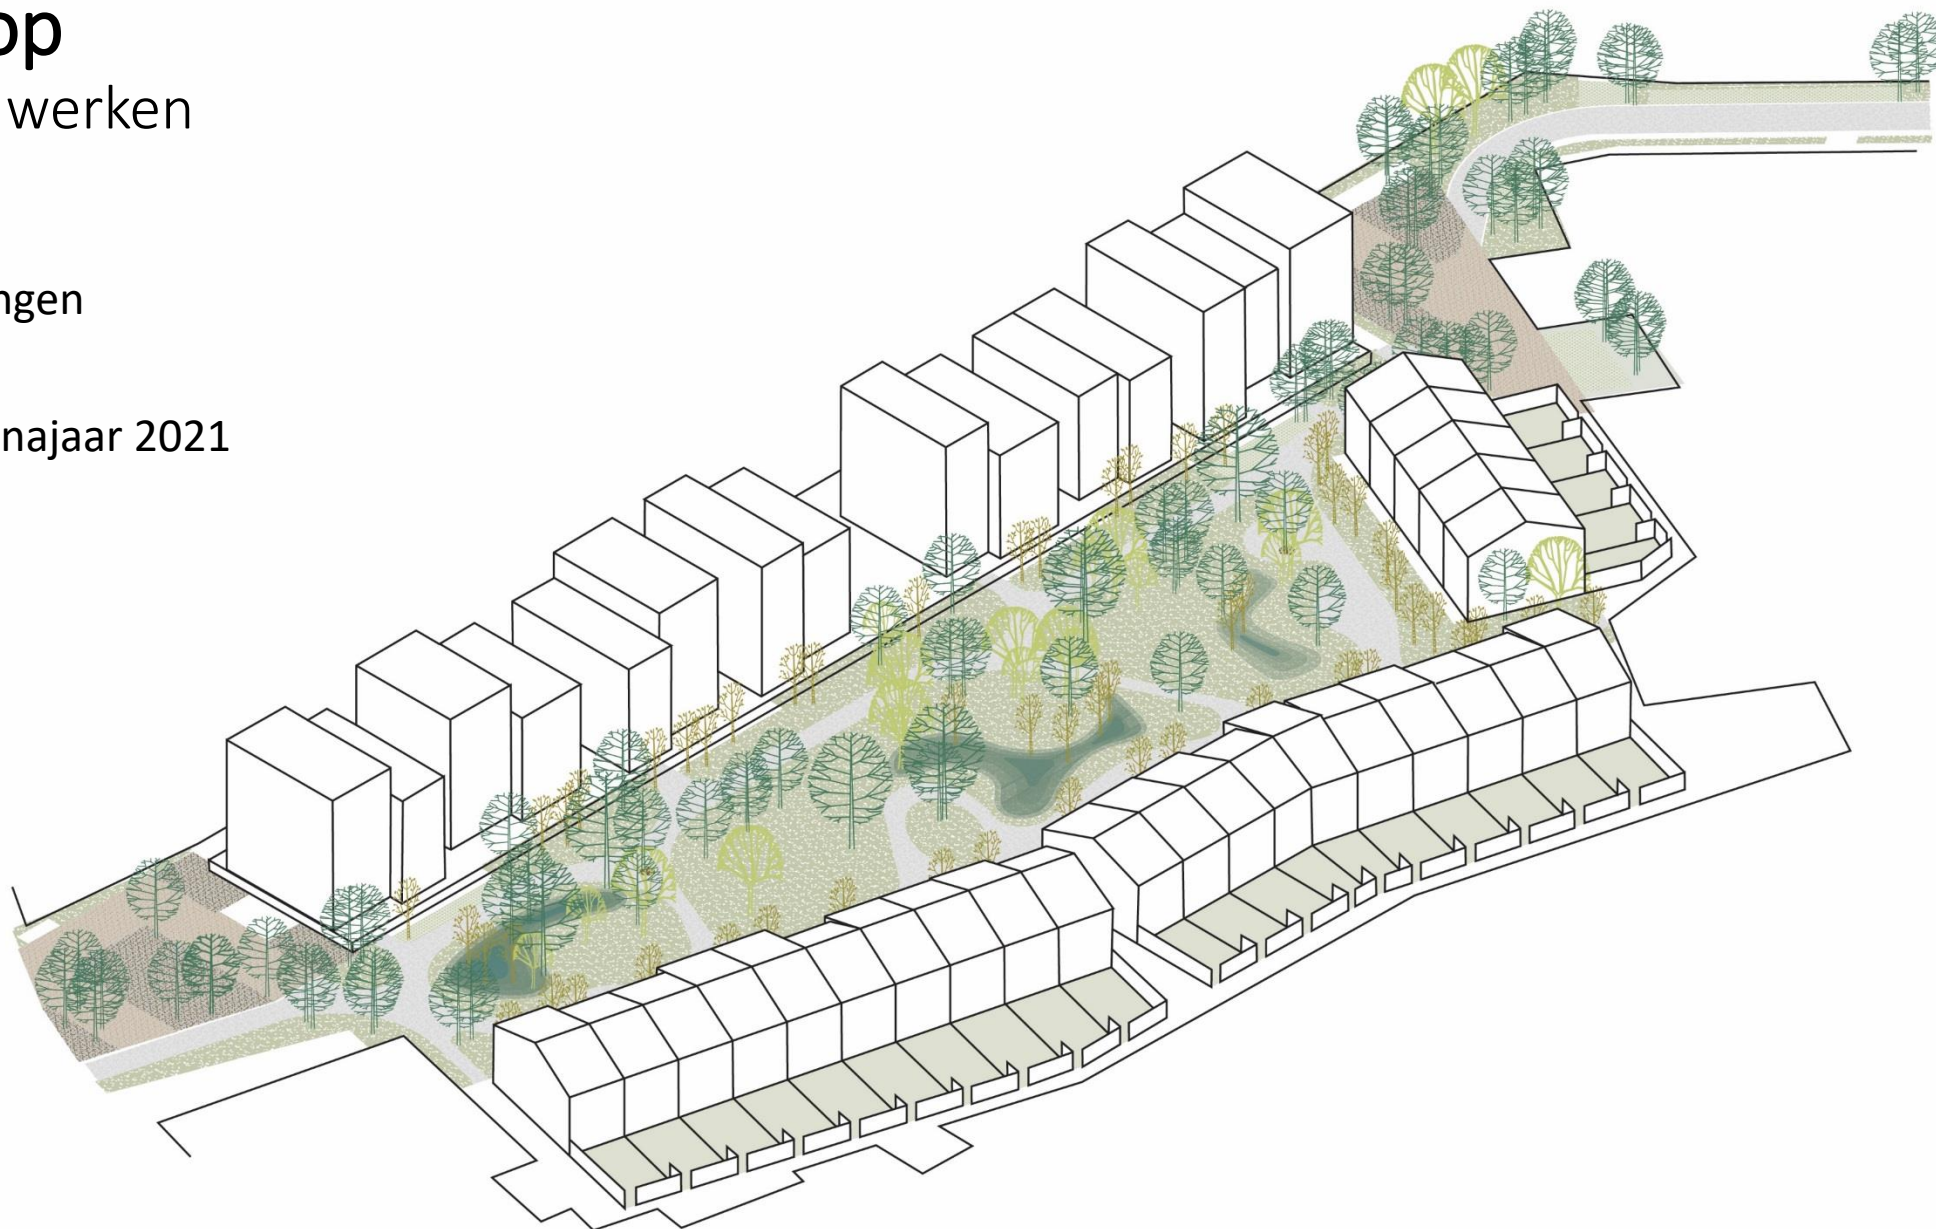

2

SANERINGSPROJECT

overzicht grondwatersanering

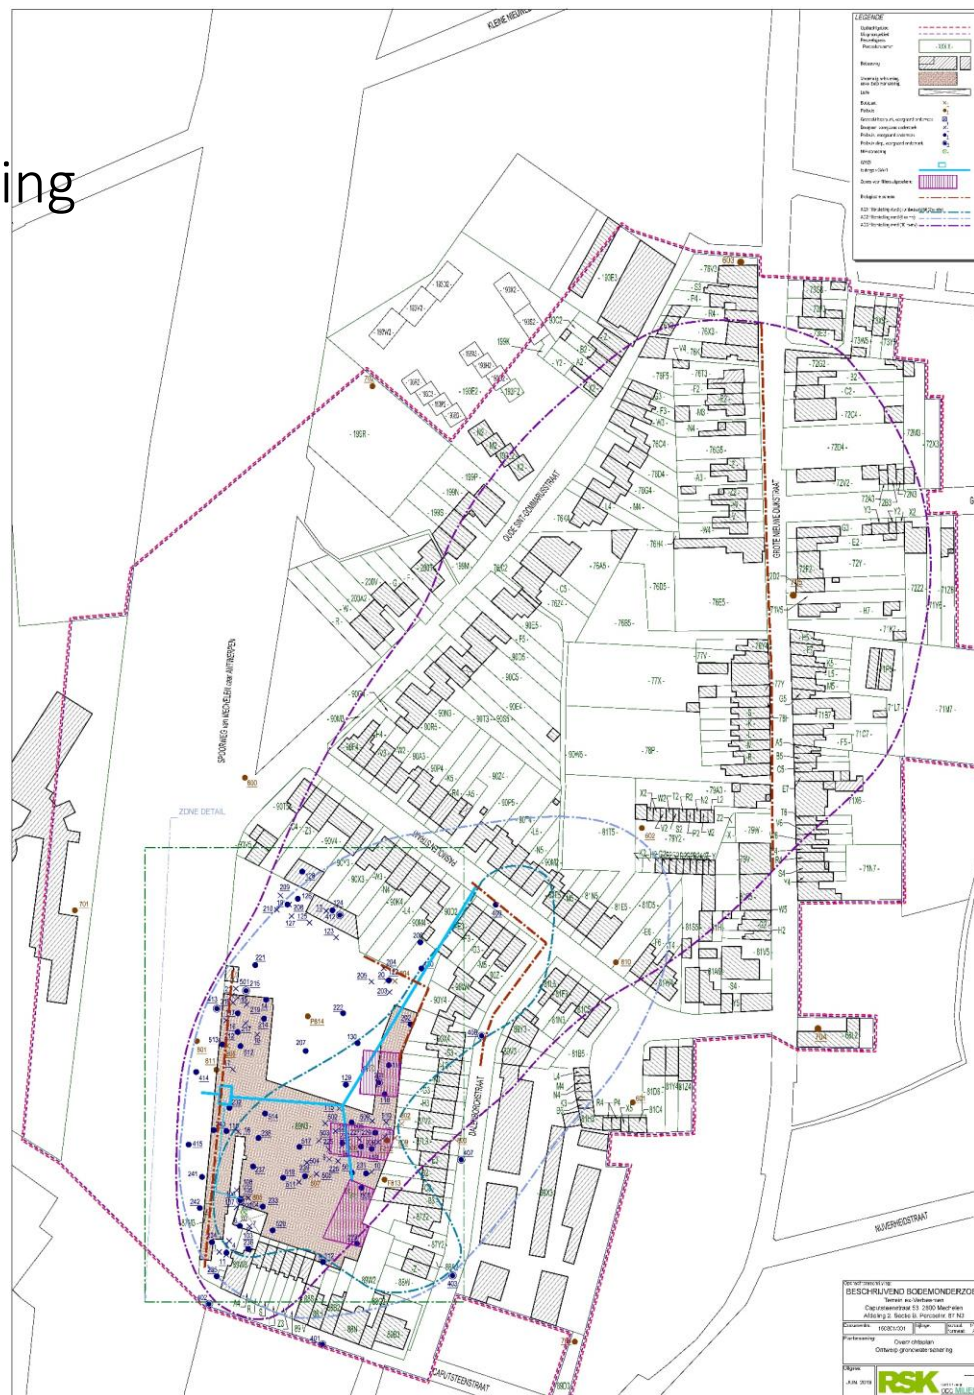

Saneringsproject

detail grondwatersanering



Saneringsproject ontgraving

