



**2021  
OPENBAAR DOMEIN  
PROJECTEN**

**MECHELEN** 

# HERAANLEG 2021

- Wegenis
- Riolering
- Groeninfrastructuur
- Fietspaden

# VLIET ZAKSTRAAT-MUNTSTRAAT

- **Toelichting project:**  
Aanleg van een vliet tussen de Zakstraat en de Muntstraat, vernieuwing van het onderliggend riool
- **Totaal budget:**  
€ 1.160.538
- **Huidige status:**  
Uitvoering (enkel nog hekwerk te plaatsen)
- **Verdere timing:**  
Oplevering februari 2021



# HOF VAN CORTENBACH

- **Toelichting project:**  
Aanleg van een nieuw binnengebied tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Ziekenliedenstraat.
- **Totaal budget:**  
€ 337.648
- **Huidige status:**  
Uitvoering
- **Verdere timing:**  
Voorziena einddatum maart 2021



# TIVOLI

- **Toelichting project:**  
Fietsverbinding van Eikestraat tot aan Tivolipark  
Fiets en voetgangersbrug over de vrouwvliet  
Parking voor het Tivolipark  
Routegeleiding fietsers door het park richting  
Otterbeek/R6/ziekenhuis
- **Totaal budget:**  
€ 1.244.000
- **Huidige status:**  
Uitvoering
- **Verdere timing:**  
Einde werken april 2021



# OUDE PLEINSTRAAT

- **Toelichting project:**  
Vernieuwing wegenis en riolering  
Oude Pleinstraat + Schorsmolenstraat  
+ Viermolenstraat
- **Totaal budget:**  
€ 553.588
- **Huidige status:**  
Aanbesteding
- **Verdere timing:**  
start in maart 2021  
einde eind 2021



# ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT

- **Toelichting project:**  
Heraanleg van riolering en wegenis in de volledige winkelstraat tussen Korenmarkt en Vijfhoek, met inbegrip van kruispunt Vijfhoek. Grote aandacht voor het verhogen van de belevingswaarde met integratie van zitelementen en groen, ruimte voor laden- en lossen en opname binnen het autoluw gebied.
- **Vastgelegd budget:** € 2.415.000
- **Huidige status:**  
uitvoeringsdossier in opmaak
- **Verdere timing:**
  - Finaliseren uitvoeringsdossier, vergunningsaanvraag
  - Werken nutsmaatschappijen (apr – juni 2021)
  - Start werken (september 2021)



# N1 BRUSSESESTEENWEG (AWV)

- **Toelichting project:**  
Aanleg fietspaden van Passade tot Abeelstraat
- **Huidige status:**  
Ontwerp goedgekeurd
- **Verdere timing:**  
Start werken april 2021  
Einde werken mei 2021






# KRUISPUNTAANPASSINGEN

- **Toelichting project:**  
In 2019 werd reeds 1/3 van de oversteekplaatsen op Mechels grondgebied geïnventariseerd. Om de toegankelijkheid van de kruispunten te verbeteren kan een aantal knelpunten aangepakt worden via het Fiets- en voetpadenteam. Voor grotere aanpassingen wordt een ontwerp opgemaakt en uitgevoerd via een externe aannemer.
- **Totaal budget:** € 450.000
- **Huidige status:**  
bestek in opmaak (intern Afdeling Beheer Openbaar Domein)
- **Verdere timing:**  
Start werken (2 locaties Dennenstraat en 3 locaties Nekkerspoelstraat)  
zomer 2021




# LIERSESTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Segment Vrouwvliet tot R6  
Vernieuwen fietspaden in asfalt  
verlagen oversteekplaatsen  
toegankelijke bushaltes
- **Vastgelegd budget:** € 750.000
- **Huidige status:**  
Ontwerp goedgekeurd op CBS
- **Verdere timing:**
  - Ramingen januari-februari
  - Aanstellen aannemer
  - Start werken najaar 2021

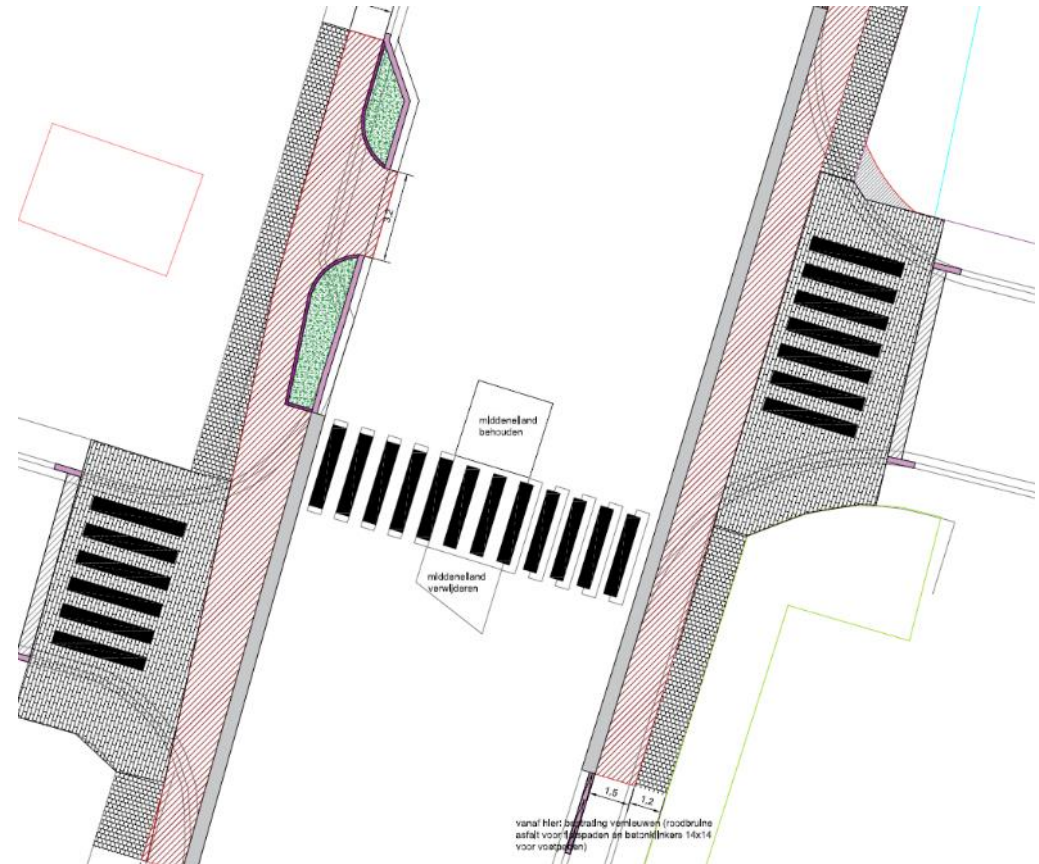


# LEESTSESTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Van zennebrug tot aan N16  
Vernieuwen fietspaden in asfalt  
Verlagen oversteekplaatsen
- **Vastgelegd budget:** € 250.125
- **Huidige status:**  
Ontwerp goedgekeurd op CBS
- **Verdere timing:**
  - Ramingen januari-februari
  - Aanstellen aannemer
  - Start werken najaar 2021

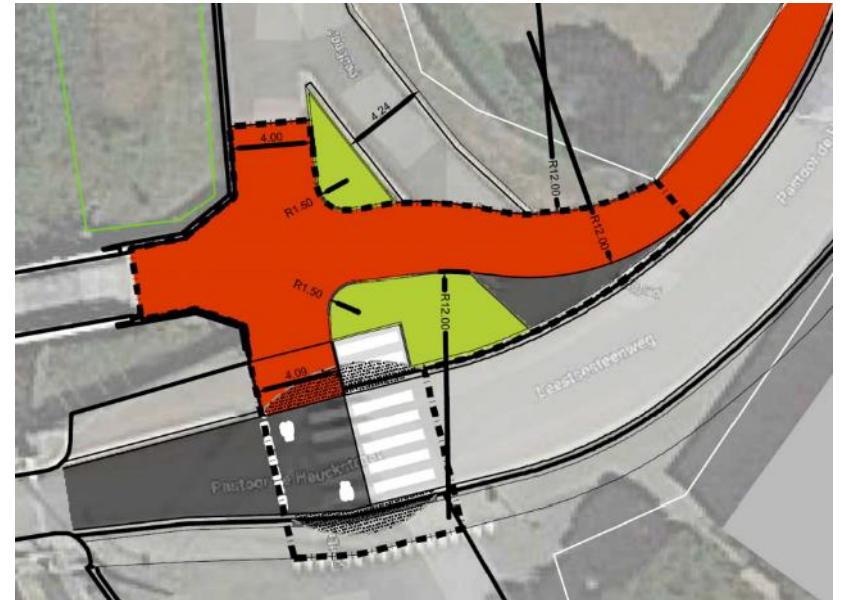

- **Toelichting project:**  
Ontwikkeling van het gebied rond het Predikherenklooster en de oude rijkswachtkazerne incl Kattebleekstraat en Van Busleydenstraat
  - Gebouwen incl ondergrondse parking door Willemen
  - Wegenis door de stad
- **Vastgelegd budget:** € 3.060.009,70
- **Huidige status:**
  - Fase 1 (wegenis rond het klooster) werd reeds volledig uitgevoerd.
  - De riolering van fase 2 incl Kattebleekstraat is geplaatst, aanleg tijdelijke asfalt volgt eerstdaags. Na realisatie van de woningen door Willemen volgen definitieve verhardingswerken – timing nog onbekend
  - Fase 3 – heraanleg Van Busleydenstraat sluit aan na fase 2
- **Verdere timing:**
  - Na realisatie van de woningen door Willemen volgen de definitiever verhardingswerken van fase 2 en de heraanleg van de Van Busleydenstraat – najaar 2021

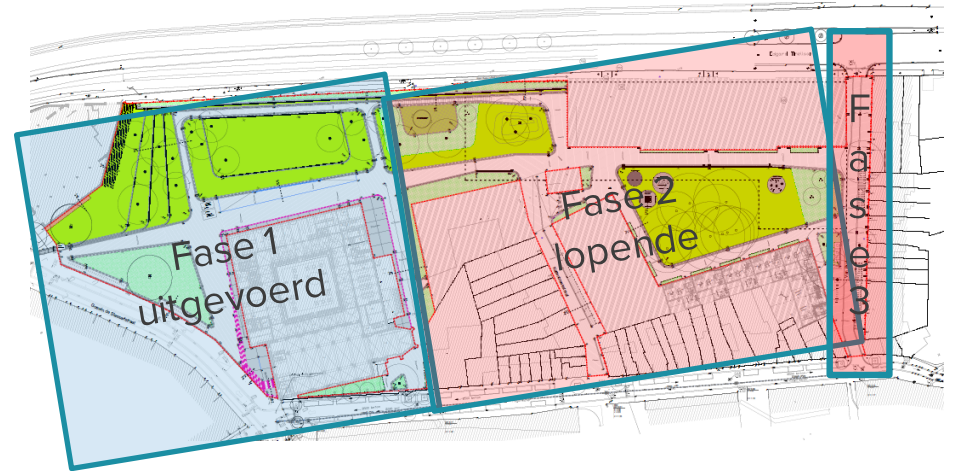

# LEUVENSESTEENWEG (AWV)

- **Toelichting project:**  
Vernieuwen fietspaden naar asfalt  
Aansluitend bij stationsproject
- **Vastgelegd budget:** € 1.400.000
- **Huidige status:**  
Ontwerp
- **Verdere timing:**  
Uitvoering najaar 2021



# ADEGEMSTRAAT

- **Toelichting project:**

Heraanleg van riolering en wegenis in de volledige Adegemstraat. Het verhogen van het fietscomfort door de aanleg van een verhoogd fietspad in tegenrichting en een betere toegankelijkheid door het voorzien van verhoogde kruispunten is cruciaal in het ontwerp. Parkeren wordt behouden waar mogelijk en groen en fietsenstallingen worden geïntegreerd.

De heraanleg van de Keerbergstraat (omwille van aansluiting riolering) en van de Olivetenstraat is in de loop van het ontwerpproces mee opgenomen.

- **Vastgelegd budget:** € 2.548.076,26

- **Huidige status:**  
uitvoeringsdossier in opmaak

- **Verdere timing:**
  - Werken nutsmaatschappijen (aug – dec 2021)
  - Start werken (eind 2021)



# DEPOT RATO

- **Toelichting project:**  
Aanleg openbaar domein rond gebouwen van de stad
- **Vastgelegd budget:** € 100.000
- **Huidige status:**  
Uitvoering gebouwen
- **Verdere timing:**  
Uitvoering OD najaar 2021



# DORPSPLEIN MUIZEN


- **Toelichting project:**  
Ontharding en opwaardering/beleving van het dorpsplein  
Aanpassingen gebruiksvriendelijkheid  
Participatietraject
- **Vastgelegd budget:** € 50.000
- **Huidige status:**  
Participatietraject wordt opgestart
- **Verdere timing:**  
Uitvoering najaar 2021





# BUFFERBEKKEN BANKSTRAAT

- **Toelichting project:**  
Aanleg bufferbekken
- **Huidige status:**  
Ontwerp
- **Verdere timing:**  
Uitvoering najaar 2021  
Operationeel voorjaar 2022

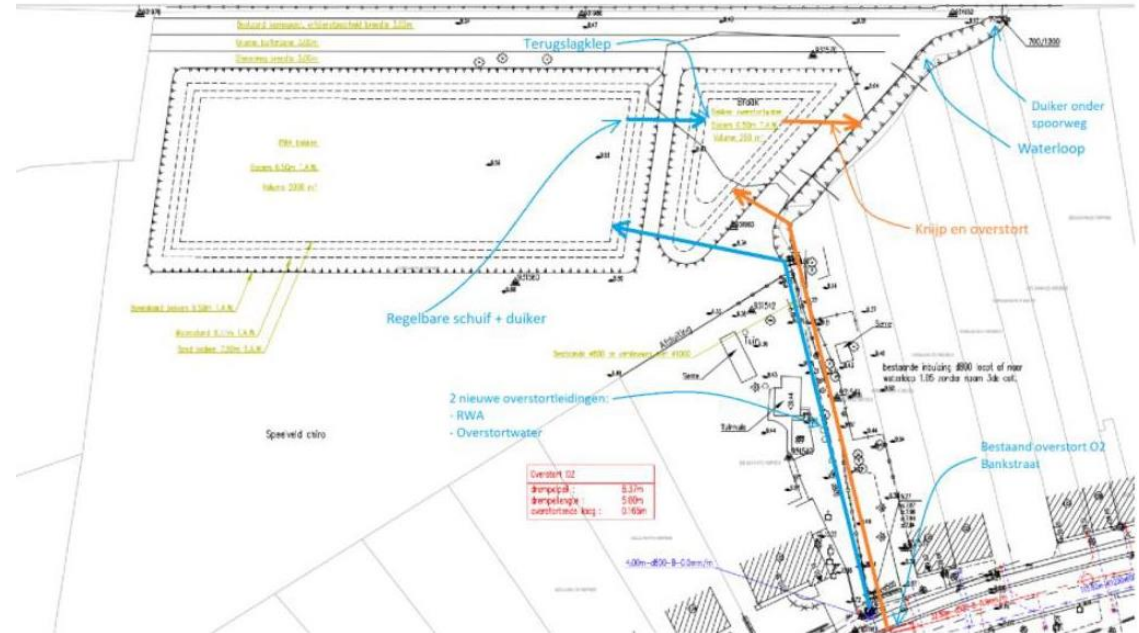


# KEERDOK/EANDIS - BRUGGEN

- **Toelichting project:**  
Aanleggen van een voetgangers- en fietsersbrug  
Aanleggen van een brug voor gemotoriseerd verkeer
- **Vastgelegd budget:** € 2.907.527
- **Huidige status:**  
Aannemer aangesteld –  
opmaak uitvoeringsdocumenten  
door aannemer
- **Verdere timing:**  
Uitvoering lopende,  
effectieve werken vanaf zomer 2021  
Oplevering maart 2022



# STATIONSOMGEVING & TANGENT

- **Toelichting project:**  
Vernieuwing en herinrichting stationsomgeving  
Aanleg van de tangent (incl. fietsinfrastructuur en fietspuzzel)
- **Vastgelegd budget:** € 17.563.265
- **Huidige status:**  
In uitvoering
- **Verdere timing:**  
Tangentfietspad: opening eind 2021  
Fietspad Colomalaan: uitvoering 2022

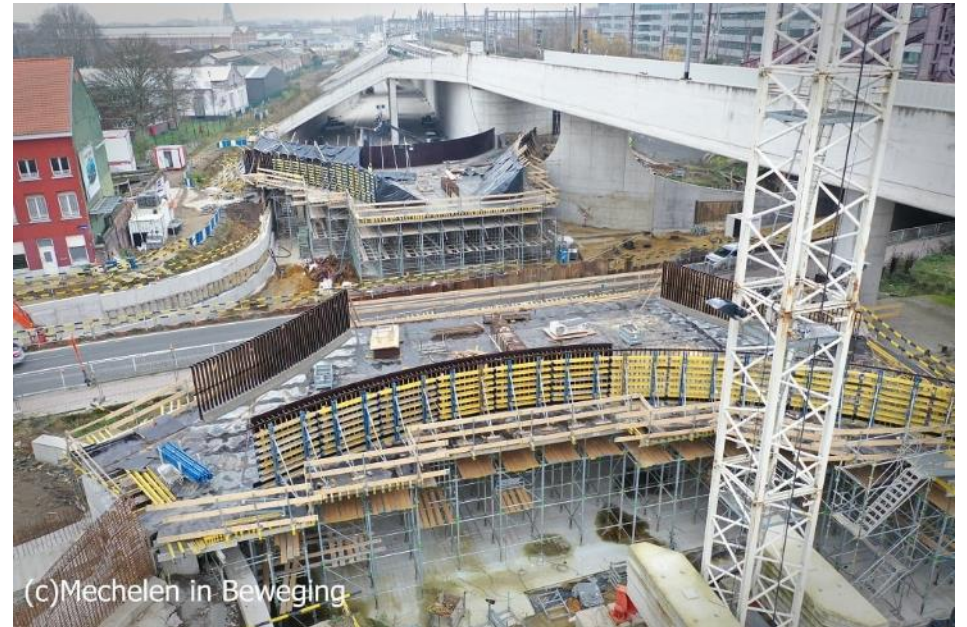

A decorative graphic on the left side of the page. It consists of a teal vertical bar on the far left. To its right is a maroon shape that is wider at the bottom and tapers to a point at the top, resembling a stylized arrow or a drop cap. The text 'ONTHARDINGEN 2021' is written in white, bold, sans-serif font within the maroon shape.

# **ONTHARDINGEN 2021**

# ONTHARDINGSPROJECTEN PAKKET

- **Toelichting project:**  
Projecten met focus op ontharding van wegenis. Een aantal van deze projecten zijn pilotcases onder het onderzoeksproject Remove, andere projecten zijn andere initiatieven van de Stad.
- **Vastgelegd budget:** jaarlijks pakket (voor 2021€ 405.000)
- **Huidige status:**
  - Spildorenlaan: ontwerp
  - Muizenhoekstraat: ontwerp
  - Hoogstratenplein: vergunningsaanvraag in opmaak
- **Verdere timing:**
  - Spildorenlaan: uitvoering voorjaar 2021
  - Muizenhoekstraat: uitvoering najaar 2021
  - Hoogstratenplein: uitvoering najaar 2021



# KORTE VELUWESTRAAT

- **Toelichting project:**  
Heraanleg van de Korte Veluwestraat met heel veel aandacht voor vergroening, ontharding en waterberging in nauw overleg met bewoners.



- **Vastgelegd budget:** € 104.500
- **Huidige status:**  
opmaak uitvoeringsdossier
- **Verdere timing:**
  - Finaliseren uitvoeringsdossier, indienen vergunningsaanvraag (begin 2021)
  - Start werken ( medio 2021)

# PAKKETTEN 2021

- Wegenis
- Riolering
- Groeninfrastructuur
- Fietspaden



# PAKKET SLIJTLAGEN

- **Toelichting project:**  
Bestek slijtlagen - contract voor 4 jaar  
Uitvoering in 2021 van volgende straten:
  - Olivetenstraat
  - Tivolilaan (tussen Liersesteenweg en de ingang van Tivolipark)
  - Wayenborgstraat
  - Papenhofdreef (tussen Paardekerkhofstraat en Nijverheidsstraat)
  - Blarenberglaan (het doodlopend stukje thv Oude Baan)
  - Oude Baan (tussen Schalienhoevedreef en Blokhuisstraat)
  - Hanswijkdries (zone die nog niet werd vernieuwd nl rijbaan rondom het plein en de zuidelijke aansluiting naar de Leuvensesteenweg. Ontharding van het centrale plein zal ook meegenomen worden)
  - Battenbroek (fietsverbinding naar dijk)
- **Vastgelegd budget:** € 1.793.000
- **Huidige status:**  
Aanbesteed
- **Verdere timing:**  
Uitvoering vanaf maart 2021





# PAKKET KASSEIWERKEN

- **Toelichting project:**  
Heraanleg / herstellingen kasseiwerken  
Uitvoering in 2021 van volgende straten:
  - Begijnenstraat
  - Guldenstraat
  - Stassaertstraat
  - Bocht Merodestraat
- **Vastgelegd budget:** € 1.897.600
- **Huidige status:**  
Bestek in opmaak
- **Verdere timing:**  
Uitvoering najaar 2021

A decorative graphic on the left side of the page. It consists of a vertical teal bar on the far left. To its right is a maroon shape that is wider at the bottom and tapers to a point at the top, resembling a stylized arrow or a chevron pointing upwards. The text is positioned within the maroon shape.

**VMSW  
PROJECTEN  
2021**



# VMSW PROJECTEN

- **Toelichting project:**  
Aandeel stad bij projecten VMSW: wegenis / openbaar domein rond gebouwen / woonerven / ...  
Timing afhankelijk van VMSW
- **Straten en wijken in uitvoering in 2021:**
  - Karperstraat – groenaanleg in uitvoering, aansluitend oplevering
  - Ankerstraat – fase 1 riolering en deel wegenis januari – april 2021 / fase 2 OD 2022
  - Oud Oefenplein – uitvoering najaar 2021
  - Neerheide Overheide – uitvoering 2021 precieze data nog niet vastgelegd
  - Gandi – uitvoering fase 4 wordt gegund, uitvoering voorjaar 2021
  - Otterbeek – uitvoering loopt gefaseerd en gaat van start maart 2021
  - Geerdegem Schonenberg – uitvoering wegenis najaar 2021
  - Kruisbaan – Uitvoering eind 2021



# PROJECTEN DERDEN

- Provincie Antwerpen
- Infrabel



# PROV: F1 BRUSSEL

- Door Provincie Antwerpen
- Toelichting project:  
Fietssnelweg richting Zemst  
Parallel aan spoorlijn  
van Passade tot brug over E19
- Raming: € 3.124.000 (totaalproject)
- Huidige status:  
Plannen zijn volledig  
Samenwerkingsovereenkomst in opmaak
- Verdere timing:  
Bouwvergunning indienen begin 2021  
Start werken najaar 2021



# SPOORBRUGGEN MUIZEN

- Muizenbrug: klaar mei 2021
- Smisstraat brug: start zomer 2021

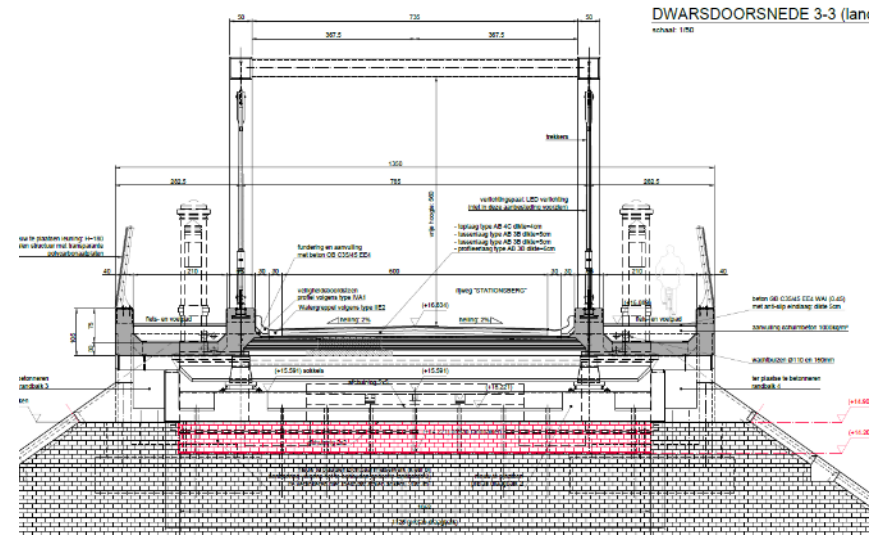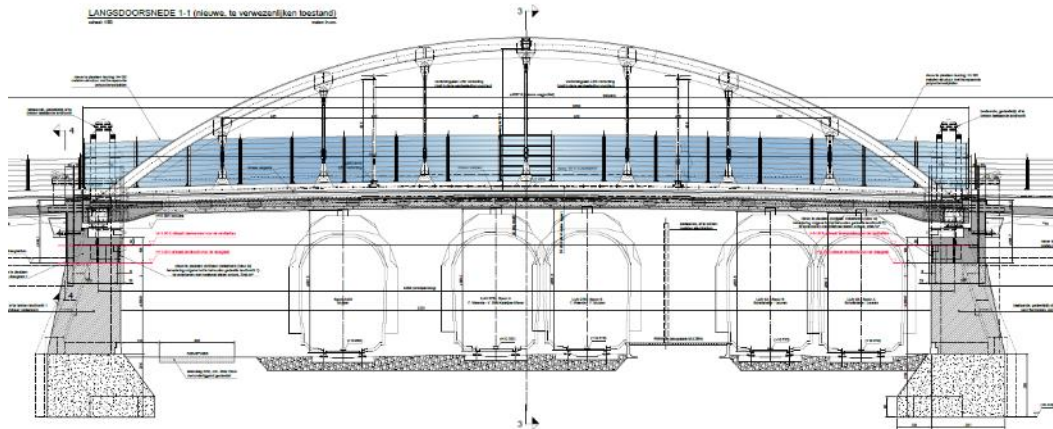



# PLANNING

- Globale planning 2021  
uitvoering

	2021												! Excl riolering	budget 2021	volledig budget (alle jaren)
	jan	feb	maart	april	mei	jun	juli	aug	sept	okt	nov	dec			
<b>Heraanleg (wegenis en/of riolering / groeninfra / fietspaden)</b>														<b>€ 7.013.720</b>	
Vliet Zakstraat-Muntstraat													-	€ 1.160.537,90	
Hof Van Cortenbach													€ 69.964,85	€ 377.647,50	
Tivoli: Eikestraat parking - Otterbeek fietsinfrastructuur													€ 278.136,09	€ 1.244.000,00	
Oude Pleinstraat / Schorsmolenstraat / Viermolenstraat													€ 553.587,57	€ 553.587,57	
Onze-Lieve-Vrouwestraat													€ 368.970,00	€ 759.091,65	
Brusselssteenweg (Passade - Abeelstraat): fietspaden													€ 75.000,00	€ 450.000,00	
Pakket Kruispuntaanpassingen: Dennestraat en Nekkerspoelstraat													€ 750.000,00	€ 750.000,00	
Liersesteenweg fietspaden (Vrouwvliet - R6)													€ 250.125,00	€ 250.125,00	
Leestsesteenweg fietspaden													€ 96.376,00	€ 98.700,37	
Tinelsite													€ 1.400.000,00		
Leuvensesteenweg: fietspaden													€ 569.009,00	€ 824.899,02	
Adegemstraat													€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Depo Rato													€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Dorpsplein Muizen													€ 1.632.551,00	€ 2.907.527,15	
Banksstraat: bufferbekken													€ 820.000,00	€ 15.263.265,48	
Keerdok- / Eandissite - brug gemotoriseerd verkeer en fietsers en voetgangersbrug													€ -	€ 2.300.000,00	
Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting															
Tangent (incl. fietsinfrastructuur, fietspuzzel)															
<b>Onthardingsprojecten</b>														<b>€ 458.375,00</b>	
Pakket onthardingsprojecten: Spildorenlaan													€ 405.000,00	€ 1.335.000,00	
Pakket onthardingsprojecten: Hoogstratenplein													€ 53.375,00	€ 78.375,00	
Pakket onthardingsprojecten: Muizenhoekstraat															
Korte Veluwestraat															
<b>Pakketten</b>														<b>€ 2.490.600,00</b>	
Pakket slijtlagen: Olivetenstraat															
Pakket slijtlagen: Tivolilaan (Liersesteenweg tot ingang Tivolipark)															
Pakket slijtlagen: Wavenborgstraat															
Pakket slijtlagen: Papehofdreef (tussen Paardekerkhofstraat en Nijverheidsstraat)													€ 593.000,00	€ 1.793.000,00	
Pakket slijtlagen: Blarenberglaan (doorlopend stukje thv Oude Baan)															
Pakket slijtlagen: Oude Baan (tussen Schalienhoevedreef en Blokhuisstraat)															
Pakket slijtlagen: Hanswijkdries (rijbaan rond plein, zuidelijke aansluiting Leuvense en ontharding centrale plein)															
Pakket slijtlagen: Battenbroek (fietsverbinding naar dijk)															
Pakket kasseiwerken: Begijnenstraat															
Pakket kasseiwerken: Guldenstraat													€ 1.897.600,00	€ 1.897.600,00	
Pakket kasseiwerken: Stassaertstraat															
Pakket kasseiwerken: bocht Merodestraat															
<b>VMSW projecten</b>															
VMSW - Karperstraat															
VMSW - Ankerstraat															
VMSW - Oud Oefenplein															
VMSW - Neerheide Overheide															
VMSW - Gandhi													€ 444.600,00	€ 444.600,00	
VMSW - Otterbeek													€ 166.926,00	€ 166.926,00	
VMSW - Geerdegem Schonenberg													€ 48.000,00	€ 48.000,00	
VMSW - Kruisbaan															
<b>Projecten derden met klein stadsaandeel</b>															
Stationsbrug Muizen (infrabel)															
Spoorbrug Smisstraat (infrabel)															
F1 - Brusselsesteenweg (Passade) tot brug E19: fietsnelweg (provincie Antwerpen)														€ 203.280,00	



